RAJHRADICKÝ
ZPRAVODAJ

Květen 2022



Jihovýchodní pohled na budovu školy. Foto: Tomáš Hájek

Škola s tělocvičnou čeká na otevření

Vážení spoluobčané,

v první polovině tohoto roku se podařilo dokončit a zkolaudovat budovu nové základní školy s tělocvičnou včetně parkovišť, zpevněných ploch, oplocení i okolní zeleně. V tomto obecním zpravodaji bychom pro vás rádi shrnuli vše, co tomu předcházelo, a nastínili další pokračování „života“ těchto, pro obec velmi důležitých budov.

Současně bychom vás chtěli informovat o komplikacích, které otevření školy bohužel provázejí. Tyto nepříjemné potíže však aktivně řešíme. Podrobnosti najdete v následujících řádcích.

Nejprve se pojďme podívat do historie.

V průběhu roku 2013 jsme se rozhodli nechat opravit a zateplit budovy základní a mateřské školy. Zajistili jsme vypracování dokumentace a vybrali zhotovitele stavby. Začátkem roku 2014 jsme získali dotaci na zateplení a výměnu oken, a to jak v základní, tak mateřské škole. 12. března 2014 zastupitelstvo obce rozhodlo, že zateplení a výměna oken se bude realizovat jen v budově MŠ. Při provádění realizační dokumentace, jejíž součástí byl také statický posudek, se však zjistilo, že kvůli špatnému technickému stavu budovy ZŠ nejsou výměna oken a zateplení budovy možné. Budovu by bylo třeba nejprve staticky zajistit a odizolovat. Ukázalo se, že náklady na tato opatření by byly velmi vysoké a stávající budova školy a její pozemky nezajišťují prostor pro další rozvoj potřeb moderní školy (prostory pro šatny, tělocvičnu, kabinety, školní dvůr je malý a stinný a podobně). Právě v tomto okamžiku se objevila první zmínka o výstavbě nové základní školy, která by splňovala požadavky na moderní výuku, a byla spojena i s tělocvičnou. O místě, které by splňovalo všechny požadavky, nebylo pochyb – mezi obchodem a fotbalovým hřištěm. Lokalita je uprostřed obce, v blízkosti hlavní silnice, pro všechny lehce dostupná. Navíc blízko stávajících sportovišť, která může škola využívat, a s dostatečně velkými obecními pozemky.

Stavba nové školy v datech

14. 11. 2016 Zastupitelům obce byly předloženy 3 architektonické studie nové budovy ZŠ (autory byli Ing. Arch. B. Jenčková, Ing. Arch. P. Jura a Ing. Arch. J. Walter). Zastupitelé se s návrhy seznámili, ale o nejvhodnějším návrhu nerozhodli.
21. 12. 2016 Zastupitelé opět posoudili jednotlivé návrhy. Jako nejvhodnější vybrali studii Ing. Arch. Waltera. Od tohoto okamžiku se stavba nové školy začala připravovat.
31. 5. 2017 Jako dodavatele projekčních prací a inženýrských činností zastupitelé vybrali Ing. Arch. J. Waltera z Brna.
červen 2017 – květen 2018 Intenzivně se připravuje projekt, konzultovaný na mnoha kontrolních dnech za účasti projektanta, odborníků na technické instalace, zástupců obce a vedení školy.
13. 11. 2018 Stavebním úřadem v Rajhradě bylo vydáno stavební povolení.
19. 12. 2018 Byla schválena úvěrová smlouva s ČSOB a.s., ve výši 53 mil. Kč na financování stavby nové školy se splatností do roku 2040.
leden 2019 Dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele.
27. 11. 2019 Schválena Smlouva o zpracování grantových projektů s firmou EU LEGAL ADVISORY s.r.o. Na základě této smlouvy obec v červnu 2020 získala na výstavbu školy dotaci ve výši 20 mil. Kč z Ministerstva financí České republiky. Nutno dodat, že se ze strany obce jednalo o třetí pokus o získání dotace.
29. 1. 2020 Na základě soutěže byl vybrán technický dozor stavby (TDS) a koordinátor Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Je zákonnou povinností obce tyto činnosti zajistit.
11. 3. 2020 Na základě výběrového řízení zastupitelé obce vybrali zhotovitele stavby, firmu UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se sídlem v Brně.
1. 4. 2020 Předáním staveniště zhotovitelské firmě odstartovaly stavební práce.
2. 4. 2020 – 30. 9. 2021 Výstavba pokračovala. Kontrolní dny na stavbě byly organizovány jednou týdně. A téměř každý den na stavbu dohlížel někdo z vedení obce.
30. 10. 2021 Obec převzala od zhotovitelské firmy dokončenou stavbu školy.
6. 4. 2022 Budova školy byla zkolaudována.

Na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provádění stavby jsme se aktivně podíleli. Velký dík patří ředitelce školy, Mgr. Blance Prišťové, která ve spolupráci s projektantem „doladila“ rozmístění jednotlivých prostor školy a při zpracování prováděcí dokumentace a pak při samotné stavbě „vdechla“ školním prostorám příjemný a účelný ráz. Jako vedení obce jsme se zase snažili doladit technické záležitosti s ohledem na budoucí provoz a účelnost budovy. Při zpracování prováděcí dokumentace jsme například pozměnili původní zasakování dešťové vody ze střech školy a tělocvičny na jejich akumulaci v podzemních nádržích. Tuto vodu bude škola využívat k zavlažování zatravněných ploch a zeleně před školou a na školním dvoře. Zároveň jsme se snažili upozornit na skutečnosti, které by mohly být zdrojem víceprací při stavbě.
Stavba s sebou nesla řadu technických problémů, které jsme museli řešit „za pochodu“. Některé byly úsměvné, například, když jsme stavební dělníky učili vázat zdivo v rozích, nebo když zapomněli na severní straně vynechat otvor pro vchodové dveře. Některé byly méně úsměvné, jako například řešení záměny odlučovače tuků nebo kvalita fasád. Každý čtvrtek v 9 hodin se na stavbě konal kontrolní den za účasti vedení obce a školy, technického dozoru, koordinátora bezpečnosti práce a zástupců zhotovitele. Kromě technické stránky stavby jsme museli řešit i stránku finanční. Některá jednání při vyjasňování finančních představ obce oproti zhotoviteli byla velmi „ostrá“. Stavbu jsme kontrolovali i mimo kontrolní dny. Měsíc po zahájení stavebních prací jsme museli vyměnit technický dozor stavebníka, který nezastupoval zájmy obce podle našich představ. Přestože jsme se účastnili projektování, narazilo se při stavbě na nejasnosti a chyby v dokumentaci. Největší problémy se ukázaly ve zpracování výčtu stavebních prací a materiálu. Některé položky v něm chyběly, některé byly naopak navíc, nebo byly nesprávné. Zároveň se ukázalo, že by bylo účelné některé věci doplnit, některé udělat jinak. Například doplnit automatické vyhřívání dešťových žlabů, uchycení předokenních rolet, změnit elektroinstalace (počet a polohu zásuvek), přidat vysoušeče vlasů apod. Některé položky se přičítaly a jiné odečítaly. Všechny tyto změny jsou uvedeny ve změnových listech, které odsouhlasil investor, autorský dozor a technický dozor stavby. Změnové listy jsou součástí dodatků ke smlouvě o dílo, které průběžně projednávalo a schvalovalo zastupitelstvo obce. Ředitelka školy v průběhu stavby dotvářela jednotlivé prostory výběrem typu a designu umyvadel, obkladů, dlažeb, linolea, koberců, nábytku i včetně detailního sestavení kladečského plánu mozaiky linolea, obkladů a dlažeb pro podlaháře a obkladače.



Podzemní nádrže na dešťovou vodu ze střech školy a tělocvičny. Foto: Tomáš Hájek



Na tyto severní dveře na dvůr stavebníci zapomněli. Foto: Tomáš Hájek

Extrémní deště zdržely stavbu o dva měsíce

Když 24. června 2021 na jižní Moravě udeřilo tornádo, stala se na stavbě velmi nepříjemná událost. Kvůli extrémně silnému dešti se do konstrukce podlahy v celém přízemí budovy školy dostala voda. V tu dobu se už stavěla tělocvična. Byla hotova základová deska, a právě ta byla všeho příčinou. Uzavření konstrukce podlahy nebylo na takový nápor vody připraveno a kvůli velkému sloupci vody na základové desce tělocvičny voda přetekla a zatopila jak konstrukce podlah v celém přízemí školy, tak výtahovou šachtu. Dodavatel stavby řešil věc jako pojistnou událost. Obec se finančně ani věcně na řešení této havárie nijak nepodílela. Sanace zatopených konstrukcí podlah v celém přízemí školy nebyla nijak jednoduchá. Všechny podlahy byly v té době již kompletně hotovy, včetně podlahových krytin. Do podlahy ve všech místnostech a chodbách v celém přízemí byl specializovanou firmou vyvrtán rastr otvorů, jimiž se pomocí ventilátorů do konstrukce podlahy vháněl a zase odváděl teplý vzduch. Na základě rozdílu vlhkosti vháněného a odváděného vzduchu se vyhodnocovala úroveň zbytkové vlhkosti. Celá tato operace stála dodavatele stavby bezmála 1 milion korun. Obec sice nic neplatila, ale dvouměsíční zdržení stavebních prací bylo velmi nepříjemné. Aby toho nebylo málo, začaly se v té době objevovat na fasádě i na zdivu uvnitř budovy trhliny. Odmítli jsme dokončenou budovu převzít a požadovali jsme po dodavateli stavby vyjádření statika. Celkově se k trhlinám vyjádřili tři statici. Statik zastupující zhotovitele, statik zastupující projektanta a nezávislý statik objednaný obcí. Všechny posudky se shodovaly v tom, že se jedná o „v podstatě běžný jev“, že jde o dotvarování stropní konstrukce. Statici konstatovali, že dotvarování železobetonových konstrukcí trvá cca 2-3 roky a pak ustane. Na základě těchto posudků, po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné



Vysoušení školy po extrémním dešti trvalo dva měsíce. Foto: Tomáš Hájek



Nosné sloupy budou podle statického auditu vyžadovat zesílení. Foto: Tomáš Hájek

kontrole stavby, a na základě splnění všech smluvních podmínek zhotovitelem jsme budovu protokolárně převzali. To nám ukládalo znění smlouvy, i když ne se všemi pracemi jsme byli zcela spokojeni. Například provedení fasád. Zde jsme po konzultaci s nezávislými odborníky přistoupili na slevu ve výši 100 tisíc korun s tím, že opravu budeme řešit v dalších letech po dotvarování všech konstrukcí. Stejná sleva byla poté dohodnuta i pro fasádu tělocvičny.
Původní stavba školy měla být spojena i s výstavbou parkoviště a příjezdové komunikace z boku budovy. Vzhledem k tomu, že se povedlo získat dotaci na školu, mohla být část finančních prostředků použita na výstavbu tělocvičny a zastupitelstvo obce rozhodlo v průběhu stavby školy i o výstavbě tělocvičny. Proto byla stavba komunikace a parkoviště odložena, aby se při stavbě tělocvičny nezničily. To zapříčinilo posun v plánovaném termínu žádosti o kolaudaci. Mezitím se usilovně pracovalo na terénních úpravách, zatravnění a ozelenění prostor před školou a na školním dvoře, instalaci brány a plotu. Zároveň řemeslníci vyráběli a instalovali nábytek ve třídách, školní družině, jídelně a šatnách, odborné firmy instalovaly vybavení počítačové i jazykové učebny a gastro zařízení do výdejny jídla.
V dubnu roku 2022 vydal na základě žádosti obce stavební úřad v Rajhradě kolaudační rozhodnutí. Protože je nutno zajistit ještě další administrativní opatření, jako je zápis do katastru nemovitostí a zápis do školského rejstříku, není možné školu otevřít ještě v tomto školním roce. S jejím otevřením se počítá v září 2022.

Neočekávané dodatečné stavební práce

Přestože jsme měli k dispozici tři statické posudky, které všechny ukazovaly na jedinou příčinu trhlin ve zdivu, chtěli jsme vědět, jestli není přece jen něco zanedbáno a dotvarování bude v obvyklých mezích. Na doporučení zastupitele Zdeňka Vágnera jsme kontaktovali dalšího statika, působícího na Vysokém učení technickém v Brně, doc. Ing. Miloše Zicha, Ph.D., AI., soudního znalce. Ten nám po prohlídce stavby a projektové dokumentace doporučil pořídit statický audit celé budovy školy, včetně základů a konstrukce střechy. Tento statický audit jsme u doc. Ing. Miloše Zicha, Ph.D., AI. objednali. Elaborát statického auditu jsme obdrželi dne 20. 4. 2022.
Součástí posudku jsou statické výpočty všech nosných konstrukcí a základů. V souladu s předešlými posudky konstatuje, že trhliny jsou zapříčiněny dotvářením budovy, především stropních konstrukcí. Na rozdíl od nich ale doporučuje preventivní, periodické sledování dynamiky trhlin a měření sedání budovy. To podstatné, co jsme nikdo nečekali, se ukázalo u konstrukce pilířů mezi okny a dělící nosné stěny ve školní družině. Výpočtem statik zjistil, že jsou poddimenzované a je nutno je zesílit. Poddimenzování je důsledkem chybného návrhu již v projektové dokumentaci pro stavební povolení a následného převzetí do dokumentace pro provedení stavby. Než budou nevyhovující pilíře a stěna zesíleny, není objekt provozuschopný. Obvodové zdivo je výrazně namáhané excentrickým zatížením ze stropních desek. Zděné pilíře a některé části stěn tak nevyhovují na mezní stav únosnosti. Je zřejmé, že nevyhovující svislé konstrukce je třeba zesílit. Na doporučení znalce jsme u firmy HURYTA s.r.o., statika a projektování staveb, objednali vyhotovení projektové dokumentace nutné na zesílení nevyhovujících svislých konstrukcí základní školy. Firma navrhla řešení pomocí dvojic ocelových stojek, které se přisunou ke zděným pilířům zevnitř a budou přenášet část svislé síly, působící na zděný pilíř. Ocelové pilíře se pomocí aretačních šroubů aktivují na předepsanou sílu. Ocelové sloupky pak budou zakryty protipožární sádrokartonovou stěnou, která bude přesně zalícována se současným ostěním otvorů. Celkem se pilíře rozšíří směrem do vnitřních prostor o 17 centimetrů. Cena dodatečných prací je v projektu vypočtena na 2.565.353,- Kč s DPH. K této částce je třeba připočítat náklady na znalecký posudek a projektovou dokumentaci na zesílení.
Právní zástupce obce bude celou záležitost řešit s projektantem a dodatečné stavební náklady vymáhat.
Velmi nás mrzí, že tato situace nastala. Všechny práce a naše úsilí, nezávisle na vývoji právního vymáhání, směřují k tomu, abychom mohli letos v září školu otevřít.

Závěrem musíme konstatovat, že přes všechny problémy bylo velké štěstí (a nutno říct, že vedení obce a zastupitelstvo obce projevilo i velký díl odvahy), že jsme nečekali na „lepší“ podmínky a stavbu školy a posléze i tělocvičny jsme zahájili. Financování školy jsme měli zajištěné úvěrem s velmi výhodnými podmínkami. Neměli jsme však přislíbenou dotaci a jistotu, že se nám podaří zajistit zhotovitele s příznivou finanční nabídkou. V té době právě vrcholil stavební boom a stavební firmy byly zahlcené. Naštěstí jsme se trefili do období, kdy velká část stavebních společností končila své závazky, a ještě neměla zajištěny další. Do výběrového řízení se přihlásilo na tu dobu neuvěřitelných 17 firem. Výsledkem byla vítězná finanční nabídka pod hranicí projekčních nákladů. Po začátku stavby se nám podařilo získat dotaci ve výši 20 milionů korun a díky ní jsme měli prostředky i na výstavbu tělocvičny. Díky hotové stavební připravenosti jsme v relativně krátkém čase vysoutěžili zhotovitele na stavbu tělocvičny a mohli zahájit stavbu. V průběhu výstavby se opět podařilo získat dotaci přes 16 milionů korun, která pokryla 80 % nákladů. V krátké době po začátku stavby se situace ve stavebnictví dost zhoršila (nedostupnost materiálů, obrovské navýšení cen stavebních prací, nedostatek pracovníků, drahé úvěry, další zvýšení cen). Pokud bychom se rozhodli stavět o půl roku později, celá stavba by se natolik zkomplikovala a prodražila, že bychom ji pravděpodobně nebyli schopni ufinancovat.
Obec je sice do roku 2040 zatížena úvěrem ve výši 53 milionů korun, ale úvěr byl uzavřen za velmi výhodných podmínek, které obci nijak podstatně nesníží možnosti financovat nebo spolufinancovat s dotačními prostředky připravované investiční akce. Obec si i díky dalším dotacím vytvořila finanční rezervu.

Nová tělocvična vyrostla za rok



Budova tělocvičny i s přilehlým parkovištěm a příjezdovou cestou. Foto: Tomáš Hájek

Stavba tělocvičny se připravovala souběžně se školou. Dokumentace byla rozdělena na tři hlavní stavební objekty. SO 01-škola, SO 02-tělocvična a SO 03-komunikace a zpevněné plochy. Při výstavbě tělocvičny jsme řešili podobné problémy s kvalitou prováděných prací jako u stavby školy, také se nás lehce dotklo zdražování stavebních materiálů v souvislosti s trvající epidemií onemocnění covid-19. Budova tělocvičny však nemá žádné statické poruchy. Budova má zcela jiné konstrukční řešení, jedná se totiž o nosný železobetonový skelet.

31. 12 2018 Stavebním úřadem v Rajhradě bylo vydáno stavební povolení.
24. 2. 2021 Na základě výběrového řízení zastupitelé obce vybrali zhotovitele stavby firmu Navláčil stavební firma, s.r.o.
30. 4. 2021 Začaly stavební práce.
Říjen 2021 Získali jsme dotaci na výstavbu tělocvičny 16.185.299,-Kč.
31. 1. 2022 Stavba byla předána obci.
20. 4. 2022 Budova tělocvičny byla zkolaudována.

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy kolem školy a tělocvičny byly stavebně povoleny současně se stavbou školy. Aby nedošlo k poškození již hotové komunikace, byla stavba záměrně posunuta až do doby, kdy budou veškeré těžké stavební práce na stavbě tělocvičny provedeny. Komunikace a zpevněné plochy byly zkolaudovány současně se školou, tedy 6.4.2022.

Náklady na výstavbu základní školy, tělocvičny, komunikace a zpevněných ploch

Celkové náklady včetně vybavení činí **89.403.673,78 Kč**


Z toho:
Škola **61.435.927,67 Kč s DPH**
Tělocvična **18.932.650,58 Kč s DPH**
Komunikace a zpevněné plochy (součástí je výměna vodovodu a kanalizace pro sportovní areál) **3.419.315,20 Kč s DPH**
Vybavení (gastro, nábytek, LCD displeje, počítačová učebna), oplocení, terénní úpravy včetně osetí, automatická závlaha travnatých ploch. **5.615.780,33 Kč s DPH**

Vyřízené dotace:
Škola 20 milionů korun z Ministerstva financí ČR
2 miliony korun od společnosti SIAD
452 tisíc korun z MAS Podbrněnsko – nábytek do šaten a jídelny
281 tisíc korun z MAS Podbrněnsko – vybavení učeben a sboroven
Tělocvična 16,2 milionů korun z Ministerstva financí ČR
Celkem obec z dotací obdržela **38.933.000 Kč**

Dále je požádáno o 360 tisíc korun z MAS Podbrněnsko na drobné vybavení školy (stoly, skříňky, regály, židle).





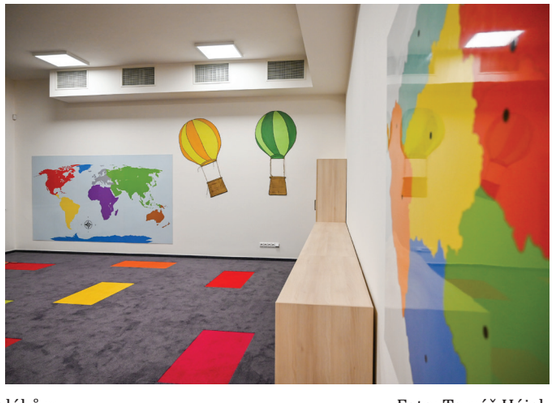

Tělocvična, školní družina i školní dvůr budou sloužit rajhradickým školákům. Foto: Tomáš Hájek

Tělocvična bude sloužit školákům, obci i sportovní veřejnosti



Konstrukce střechy nad tělocvičnou vznikla v srpnu 2021. Foto: Tomáš Hájek

Nová krásná tělocvična při nové základní škole je určena především pro školní výuku a dokonale splňuje veškeré požadavky pro výuku tělocviku. Má jednu z nejlepších palubovek pro míčové hry. Obvodové stěny jsou obloženy latěmi, za nimiž jsou skryty radiátory, které tak nepřekáží a nehrozí případné úrazy. Lajnování umožňuje hrát základní míčové hry (basketbal, házenou, florbal, volejbal, sálovou kopanou, vybíjenou). Navíc jsou na stranách umístěny koše pro nácvik basketbalu, současně až pro čtyři skupiny dětí.
Pro výuku je možné použít sadu šplhacích tyčí a lano, umístěné v rohu tělocvičny. Na čelní stěně u vchodu jsou čtvery žebřiny. Ze stěny uprostřed tělocvičny je možné vysunout výškově nastavitelnou hrazdu pro výuku gymnastických prvků.
Tělocvična je vybavena vzduchotechnikou s automatickým provozem a nastavitelným režimem. Stejně tak je možné nastavit teplotu v tělocvičně. Zároveň se může tělocvična větrat okny, umístěnými pod stropem. Který způsob větrání bude preferován už je na učitelích. Tělocvična je samozřejmě vybavena nářaďovnou pro uschování sportovních pomůcek potřebných pro výuku tělocviku. Děti mají k dispozici šatny se sprchami. Ty jsou umístěny v budově školy při příchodu k tělocvičně. Naproti přes chodbu jsou sociální zařízení. Projekt pamatoval i na možnost přítomnosti rodičů (a přátel školy) při některých vybraných školních akcích. V čele tělocvičny nad hlavním vchodem je umístěna prostorná galerie, přístupná z druhého podlaží. Z galerie je výhled shora na celou tělocvičnu.

Mimoškolní provoz

Od samotného začátku plánování tělocvičny jsme počítali s využitím tělocvičny i pro širokou sportovní veřejnost a pro vybrané kulturní akce. Po ukončení výuky, tj.ve všední den mimo prázdnin po 16. hodině budou moci tělocvičnu využívat sportovní oddíly a sdružení z Rajhradic i skupiny sportovců. Pokud nebude v tělocvičně akce organizovaná školou nebo obcí.
Obsazenost tělocvičny v mimoškolních hodinách bude transparentně evidována na samostatných webových stránkách tělocvičny. Zde si budou zájemci v rezervačním systému dopředu zadávat požadavky na termín. Rozhodující pro zajištění termínu bude čas - platí okřídlené „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Přednost v zajištění termínů ale budou mít organizované kluby a zájmové skupiny rajhradických sportovců. Ti budou mít možnost si termíny dopředu zajistit pravidelně, např. fotbalová přípravka, jóga, florbal apod. Malé neorganizované skupinky a nepravidelné skupinky sportovců budou využívat zbývající volné termíny. Provoz tělo-

cvičny se bude řídit provozním řádem. Počítá se s tím, že nastavení pravidel se může časem „dolaďovat“ na základě zkušeností z provozu.
Rada obce se dohodla, že mimoškolní provoz tělocvičny bude mít na starosti Bc. Robert Hájek. Pan Hájek je vystudovaný v oboru sportovního managementu, již se stará o provoz fotbalového hřiště a ze své profese má zkušenosti s řízením provozu tělocvičen.
Pro mimoškolní využití tělocvičny bude sloužit boční vchod do krčku spojujícího školu s tělocvičnou. Školní budova bude v tu dobu uzamčena a vstup do ní nebude možný. Pro otevření bočního vchodu budou sloužit elektronické čipy, které obdrží vždy vedoucí skupiny. Každý vstup i odchod budou načteny do paměti systému. Pro sportovce bude sloužit samostatná šatna na galerii, sprchy a sociální zařízení v krčku u tělocvičny.
Tím je zajištěno, že mimoškolní provoz tělocvičny bude mít své šatny, sprchy a sociální zařízení v krčku a škola rovněž své ve školní budově. Začátek provozu tělocvičny, jak pro školní, tak pro mimoškolní využití bude od září 2022.
V tělocvičně bude možné konat i mládežnické sportovní turnaje, organizované školou, obcí, sportovním oddílem nebo sportovním sdružením obce Rajhradice a při účasti alespoň jednoho rajhradického sportovního družstva. O možnosti konání takového turnaje v tělocvičně rozhodne vedení obce po



Tělocvična je již plně vybavená sportovním náčiním. Foto: Tomáš Hájek

předložení informací o době konání, odpovědné osobě za akci, plánovaném průběhu a organizačním a technickém zajištění. Při souběhu termínů budou mít přednost akce organizované školou.
V tělocvičně bude možné mimořádně pořádat významné kulturní a společenské akce v obci, jejichž význam nebo předpokládaný počet účastníků přesáhnou možnosti kulturního sálu při obecním úřadě. Protože je tělocvična určena pro sport, předpokládá se, že mimoškolní kulturní akce budou v tělocvičně pořádány pouze výjimečně. O tom, která akce bude konána v tělocvičně, rozhodne vedení obce.

Jsme přesvědčení, že škola s tělocvičnou bude sloužit ku prospěchu všech občanů Rajhradic, hlavně dětí a mládeže.

Luboš Přichystal, starosta obce
Ing. František Marcián, místostarosta obce

Informace o Rajhradicích • Elektronická úřední deska
Kalendář obecních akcí • Spolky a sdružení

WWW.RAJHRADICE.CZ

Veřejné vyhlášky • Rady a tipy, jak si co vyřídit!
E-podatelna • Poplatky a služby • Služby a firmy
